DISEÑOS CONCEPTUALES
PROYECTO HIDROELECTRICO CHILÍ
CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHILÍ**	**1284 días**	**mar 01/03/11**	**vie 05/09/14**
2	**1.1**	**DISEÑOS DE DETALLE**	400 días	mar 01/03/11	mié 04/04/12
3	**1.2**	**ASESORÍA DURANTE CONSTRUCCIÓN Y PARA EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS**	1000 días	vie 09/12/11	jue 04/09/14
4	**1.3**	**LÍNEA DE TRANSMISIÓN**	365 días	lun 01/08/11	mar 31/07/12
5	**1.4**	**CONSTRUCCIÓN**	**1070 días**	**mar 02/08/11**	**lun 07/07/14**
6	**1.4.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**50 días**	**mar 02/08/11**	**mié 21/09/11**
7	**1.4.2**	**VIAS DE ACCESO**	**250 días**	**mié 10/08/11**	**lun 16/04/12**
8	1.4.2.1	VIA DE ACCESO A LAS OBRAS DE CAPTACIÒN Y POZO No. 1	250 días	mié 10/08/11	lun 16/04/12
9	1.4.2.1.1	Adecuación sitio de depósito No. 1	40 días	mié 21/09/11	lun 31/10/11
10	1.4.2.1.2	Acondicionamiento vía de acceso (Vía a Santa Elena)	250 días	mié 10/08/11	lun 16/04/12
11	1.4.2.1.3	Construcción vía de acceso a captación	100 días	jue 06/10/11	sáb 14/01/12
12	**1.4.2.2**	VIA DE ACCESO A LA VENTANA DE CONSTRUCCIÓN	**135 días**	**mié 21/09/11**	**vie 03/02/12**
13	1.4.2.2.1	Adecuación sitio de depósito No. 2	60 días	mié 21/09/11	dom 20/11/11
14	1.4.2.2.2	Construcción vía de acceso a ventana	120 días	jue 06/10/11	vie 03/02/12
15	1.4.2.3	VIA DE ACCESO AL FRENTE DE CASA DE MAQUINAS Y DESCARGA	127 días	mié 10/08/11	jue 15/12/11
16	1.4.2.3.1	Adecuación sitios de depósito Nos. 3 y 4	120 días	mié 10/08/11	jue 08/12/11
17	1.4.2.3.2	Acondicionamiento vía de acceso (Vía a La Selva)	100 días	mié 10/08/11	vie 18/11/11
18	1.4.2.3.3	Construcción vía de acceso a Casa de Máquinas y descarga	90 días	mié 17/08/11	mar 15/11/11
19	1.4.2.3.4	Excavación Plazoleta Túnel de acceso	30 días	mar 15/11/11	jue 15/12/11
20	**1.4.3**	**OBRAS DE DERIVACIÒN Y CAPTACIÒN**	**450 días**	**lun 31/10/11**	**mié 23/01/13**
21	1.4.3.1	Construcción captación margen derecha (Desarenador, estructura compuerta,etc)	250 días	lun 31/10/11	sáb 07/07/12
22	1.4.3.2	Construcción margen izquierda (azud, muro izquierdo)	200 días	sáb 07/07/12	mié 23/01/13
23	**1.4.4**	**CONDUCCIÓN**	**950 días**	**mié 30/11/11**	**lun 07/07/14**
24	1.4.4.1	POZO DE PRESIÒN No.1	100 días	mié 30/11/11	vie 09/03/12
25	1.4.4.2	VENTANA DE CONSTRUCCIÓN	120 días	vie 03/02/12	sáb 02/06/12
26	1.4.4.3	TÚNEL DE CONDUCCIÓN SUPERIOR	735 días	sáb 02/06/12	sáb 07/06/14
27	**1.4.4.4**	**TÙNEL DE CONDUCCIÒN INFERIOR**	**680 días**	**dom 26/08/12**	**lun 07/07/14**
28	1.4.4.4.1	Excavación túnel de conducción inferior	120 días	dom 26/08/12	lun 24/12/12
29	1.4.4.4.2	Revestimiento túnel de conducción inferior	35 días	mar 19/11/13	mar 24/12/13
30	**1.4.4.4.3**	**POZO DE PRESIÓN No. 2**	**560 días**	**lun 24/12/12**	**lun 07/07/14**
31	1.4.4.4.3.1	Excavación pozo	210 días	lun 24/12/12	lun 22/07/13
32	1.4.4.4.3.2	Revestimiento pozo	120 días	lun 22/07/13	mar 19/11/13
33	1.4.4.4.3.3	Tapones de concreto en ventana de construcción	30 días	sáb 07/06/14	lun 07/07/14
34	**1.4.5**	**TÙNEL DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS**	**240 días**	**mié 26/10/11**	**vie 22/06/12**
35	**1.4.6**	**TÙNEL DE DESCARGA**	**640 días**	**mar 15/11/11**	**vie 16/08/13**
36	**1.4.7**	**TÚNELES DE CONSTRUCCIÓN**	**60 días**	**vie 22/06/12**	**mar 21/08/12**
37	**1.4.8**	**CASA DE MAQUINAS**	**420 días**	**vie 22/06/12**	**vie 16/08/13**
38	**1.4.9**	**FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DEL BLINDAJE Y DISTRIBUIDORES**	**419 días**	**sáb 30/03/13**	**vie 23/05/14**
39	1.4.9.1	Fabricación y transporte del blindaje y distribuidor	180 días	sáb 30/03/13	jue 26/09/13
40	1.4.9.2	Montaje del blindaje y distribuidor	150 días	mar 24/12/13	vie 23/05/14
41	**1.5**	**FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**	**1079 días**	**sáb 30/04/11**	**dom 13/04/14**
42	**1.5.1**	**Fabricación y transporte equipos electromecánicos**	**810 días**	**sáb 30/04/11**	**jue 18/07/13**
43	**1.5.2**	**Montaje equipos electromecánicos**	**240 días**	**vie 16/08/13**	**dom 13/04/14**
44	**1.6**	**PUESTA EN MARCHA**	**60 días**	**lun 07/07/14**	**vie 05/09/14**

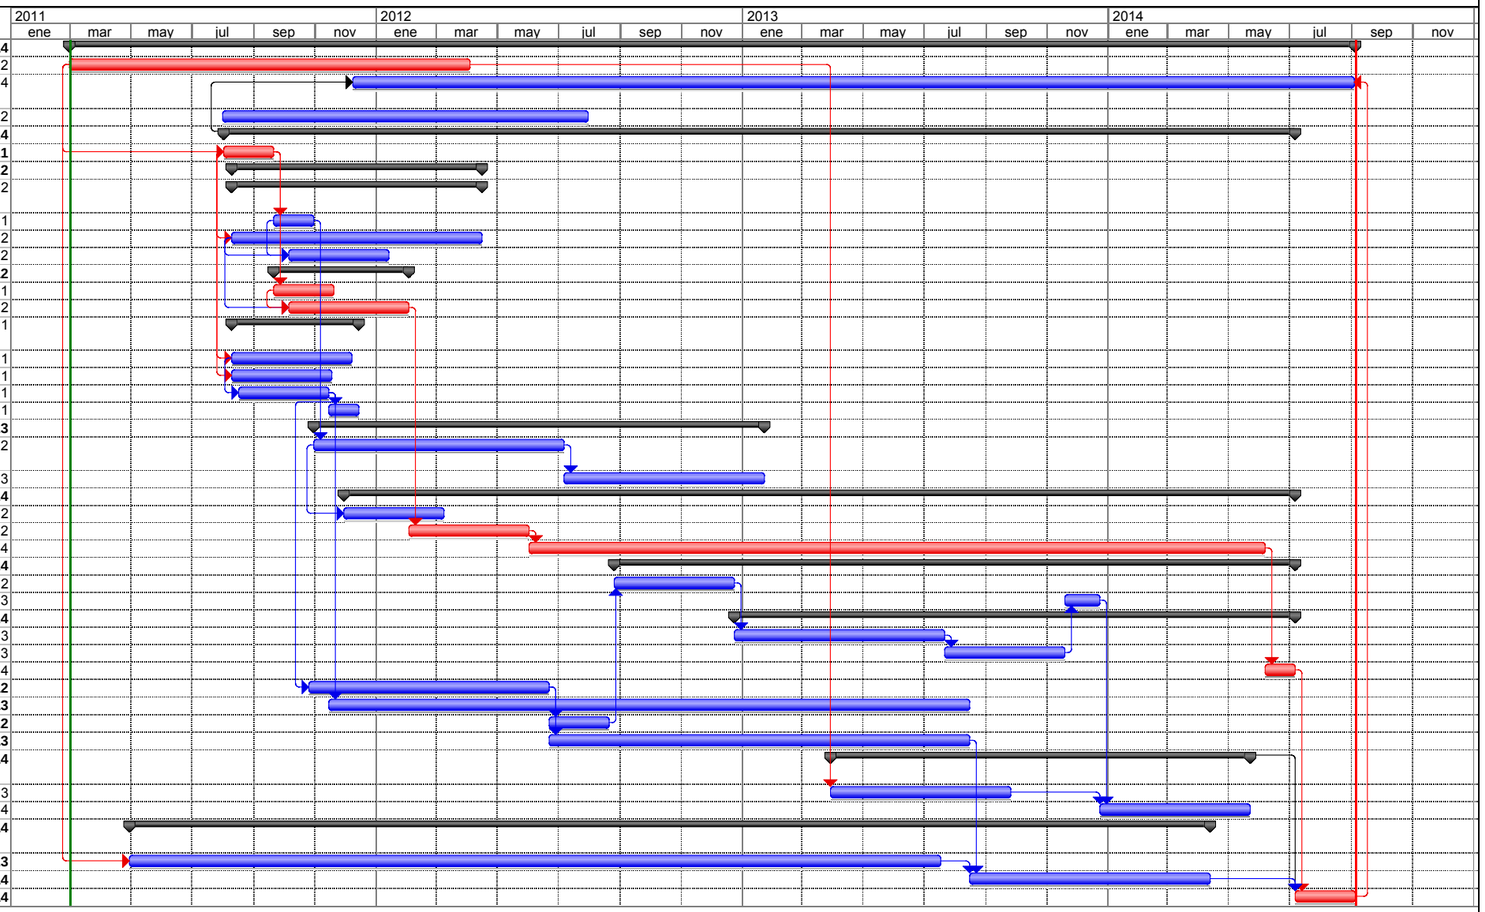

Proyecto: Programa Chili
Fecha: lun 25/10/10

ā□ɖɖ#○1$○1 □□□□□□□□□□□Gā□ĀĀ#○1$○1
